

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления»
КАФЕДРА «Г	

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по курсу «Экономика программной инженерии»

на тему: «Планирование программного проекта в Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта»

Студент <u>ИУ7-81Б</u> (Группа)	(Подпись, дата)	Постнов С. А. (Фамилия И. О.)
Преподаватель	(Подпись, дата)	Силантьева А. В. (Фамилия И. О.)
Преподаватель	(Подпись, дата)	<u>Барышникова М. Ю.</u> (Фамилия И. О.)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Ход	цработ	гы	3
	1.1	Трени	ровочное задание	3
		1.1.1	Условие задания	3
		1.1.2	Результаты выполнения задачи	4
1.2 Основное задание				4
		1.2.1	Содержание проекта	4
		1.2.2	Задание 1: Настройка рабочей среды проекта	4
		1.2.3	Задание 2: Создание списка задач	7
		1.2.4	Задание 3: Структурирование списка задач	7
		1.2.5	Задание 4: Установление связей между задачами	8
D	ывол			9
L)	ывод	.DI		9

1 Ход работы

1.1 Тренировочное задание

1.1.1 Условие задания

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками (вариант №3):

Название работы	$ \mathcal{L}_{\Lambda} u m e \Lambda b h o c m b \left(\partial h u \right) $
Работа А	3
Работа В	4
Работа С	1
Работа D	4
Работа Е	5
Работа F	7
Работа G	6
Работа Н	5
Работа I	8

Дата начала проекта — 1-й рабочий день февраля текущего года (03.02.2025). Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

- 1) предусмотреть, что D исходная работа проекта;
- 2) работа Е следует за D;
- 3) работы A, G и C следуют за E;
- 4) работа В следует за А;
- 5) работа Н следует за G;
- 6) работа F следует за С;
- 7) работа I начинается после завершения В, Н, и F.

Тип задач по умолчанию — Φ иксированный объем ресурсов. Так как чем больше привлекается ресурсов, тем больше вероятность ускорить выполнение.

1.1.2 Результаты выполнения задачи




Рисунок 1.1 – Результаты выполнения задачи

1.2 Основное задание

1.2.1 Содержание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1.2.2 Задание 1: Настройка рабочей среды проекта

На рисунке 1.2 представлены сведения о проекте.




Рисунок 1.2 – Сведения о проекте

На рисунке 1.3 представлены изменения в расписании проекта.

Изменение параметров, относящихся к планированию, календарям и расчетам.					
<u>П</u> араметры календаря для этого про	ректа: 📴 task1.m	npp •			
День начала недели: Меся <u>и</u> начала финансового года: <u>И</u> спользовать год нача. Время начала по умолчанию: Время окончания по умолчанию: Часов в дне: <u>Ч</u> асов в неделе: Дней в месяце:	Понедельник ▼ Январь ▼ ла для обозначения 9:00 ▼ 18:00 ▼ 8	финансового года Эти значения времени присваиваются задачам, для которых при вводе дат начала и окончания не указывается время. При изменении этих значений рекомендуется привести в соответствие календарь проекта с помощью команды "Изменить рабочее время" на вкладке "Проект" на ленте.			
Расписание ✓ Показывать сообщения о планировании Показывать единицы назначений в виде: процентов т					
Пара <u>м</u> етры планирования для этого	проекта: 📴 tas	k1.mpp 🔻			
Нов <u>ы</u> е задачи:		Автоматическое планирование			
Автоматически планируемые <u>з</u> адачі	и планируются на:	дату начала проекта 🔻			
<u>Дл</u> ительность вводится в:		неделях ▼			
<u>Т</u> рудозатраты вводятся в:		часах ▼			
Т <u>и</u> п задач по умолчанию:		Фиксированные трудозатраты			
✓ Новые задачи имеют фиксирова работ	нный объем 🤇	 Даты ограничений для задач всегда соблюдаются □ Показать наличие оценок длительности для запланированных задач 			
☐ Автоматическое связывание вста перемещенных задач	ввленных или	 ✓ Оценка длительности для запланированных задач 			
✓ Прерывание выполняющихся за	дач 🛈	Относить задачу на <u>с</u> ледующий рабочий день при переключении в			
— режим автоматического планирования ✓ <u>О</u> бновлять задачи, запланированные вручную, при редактировании связей					

Рисунок 1.3 – Изменения в расписании проекта

На рисунке 1.4 представлено изменение настройки календаря.




Рисунок 1.4 – Изменение настройки календаря

На рисунке 1.5 представлено добавление праздников и сокращенных дней с выходными.

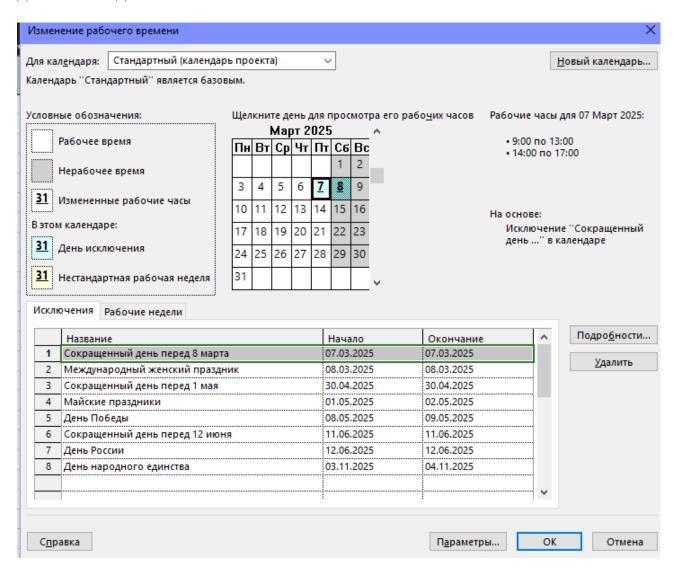


Рисунок 1.5 – Добавление праздников и сокращенных дней с выходными

На рисунке 1.6 представлены сведения о суммарной задаче и заметка.

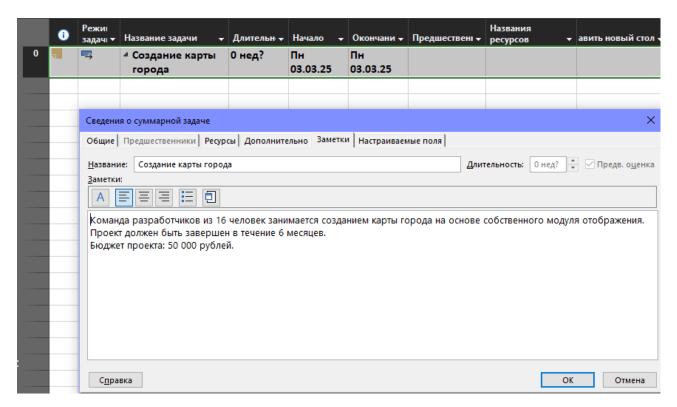


Рисунок 1.6 – Сведения о суммарной задаче и заметка

1.2.3 Задание 2: Создание списка задач

На рисунке 1.7 представлен список задач в проекте.

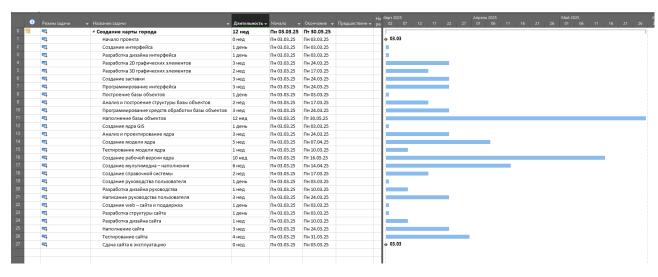


Рисунок 1.7 – Список задач в проекте

1.2.4 Задание 3: Структурирование списка задач

На рисунке 1.8 представлен структурированный список задач в проекте.

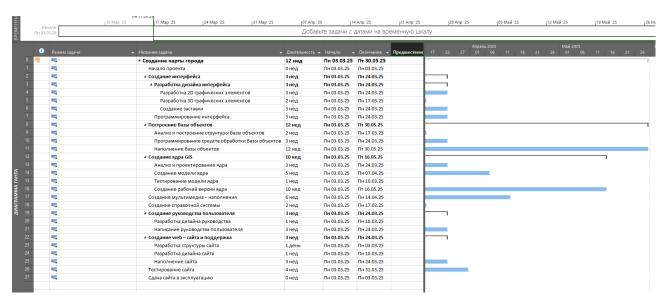


Рисунок 1.8 – Структурированный структурированный список задач

1.2.5 Задание 4: Установление связей между

задачами

На рисунке 1.9 представлен структурированный список задач с установленными связями в проекте.

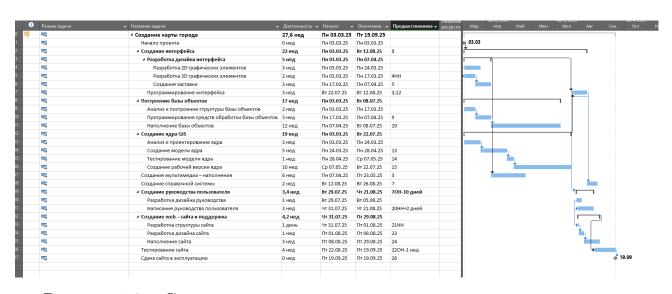


Рисунок 1.9 — Структурированный структурированный список задачс установленными связями

выводы

В результате планирования программного проекта в *Microsoft Project* было определено, что завершение разработки произошло с опозданием по срокам на 16 дней (6 месяцев и 16 дней), что позволяет глубже проанализировать ошибки и трудности, возникшие в ходе работы, а также внести коррективы в дальнейшее планирование задач.
